



[ITA] BeCharge | Report Commissioning rev.01

27377 / Quinto Vicentino

Complete

Flagged items

0

Nome del progetto:

Quinto Vicentino

Codice del progetto:

27377

Indirizzo (Città/Via/CAP):

Via Vittorio Veneto,141,36050
Quinto Vicentino (VI)

Data di Commissioning

22.01.2024 13:36 CET

Ditta installatore

Dp Service Energy Srl

Quadro contatore	
Tipo di connessione	Connessione da distributore
DSO	E-distribuzione
Il vano contatore è accessibile?	Sì
Fotografia codice cliente (POD)	
 Photo 1	
Panoramica vano POD	
 Photo 2	
Il vano interruttori è accessibile?	Sì, è lo stesso del vano contatore
Taglia interruttore/i generale/i	63 A
L'interruttore è selettivo? (Simbolino con la S dentro un quadratino)	Sì
  Photo 3 Photo 4	
Verifica dei cablaggi su interruttore/i e contatore	Pass

Dati EVC

Tipologia di EVC in campo

Ensto EVF/EVB

Numero di Ensto EVF/EVB in campo

2

Seriale EVC (N.1)



Photo 5

Coordinate EVC (N.1)




Photo 6

Codice presa Master/Slave (Con led verde) EVC (N.1)



Photo 7



Photo 8

Girofasi EVC (N.1)	L1-L2-L3 -- L3-L1-L2
---------------------------	-----------------------------

L1-L2-L3 -- L3-L1-L2




Photo 9

Seriale EVC (N.2)



Photo 10

Coordinate EVC (N.2)



Photo 11

Codice presa Master/Slave (Con led verde) EVC (N.2)



Photo 12



Photo 13

Girofasi EVC (N.2)

L1-L2-L3 -- L2-L3-L1




Photo 14




Photo 15

è stata effettuata la configurazione lato Master e lato Slave?

Si

Verifiche Elettriche

Misura resistenza di terra (Ω) (Foto con seriale di sfondo x ogni EVC)

< 80



Photo 16



Photo 17

Tipo di sistema elettrico

TT

Verifica tensione P-P (400 V)

Pass

Verifica tensione P-N (230 V)

Pass

Verifica tensione N-PE (< 5 V)

Pass

Verifica funzionamento differenziale (Pulsante TEST)

Pass

Resistenza di isolamento ($M\Omega$)

9999

Tempo di intervento del differenziale (ms)

150

Corrente di intervento del differenziale (mA)

300

Funzionamento EVC

LED verde fisso sulle prese

Pass

Prova di ricarica

Pass



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21

Location finale

Fotografie ripristino scavi



Photo 22

Segnaletica orizzontale

Presente



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26

Segnaletica verticale

Presente



Photo 27

Note/Foto aggiuntive

Logo su EVC

Plenitude+BeCharge

Firme

Nome del tecnico

Soranzo Alessandro

Firma



Alessandro Soranzo
22.01.2024 14:25 CET

Media summary



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5

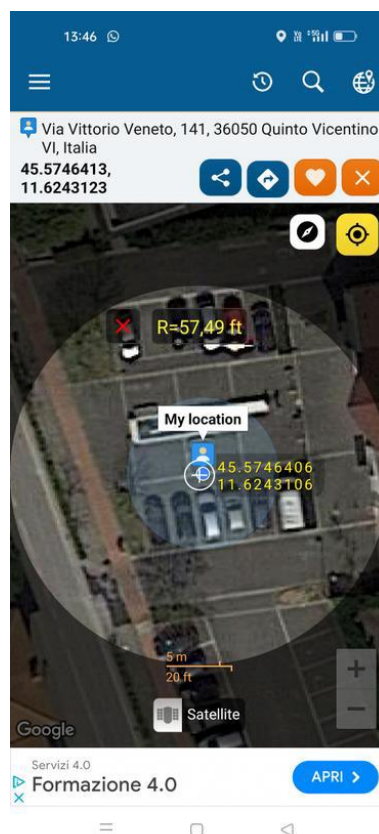


Photo 6



Photo 7



Photo 8

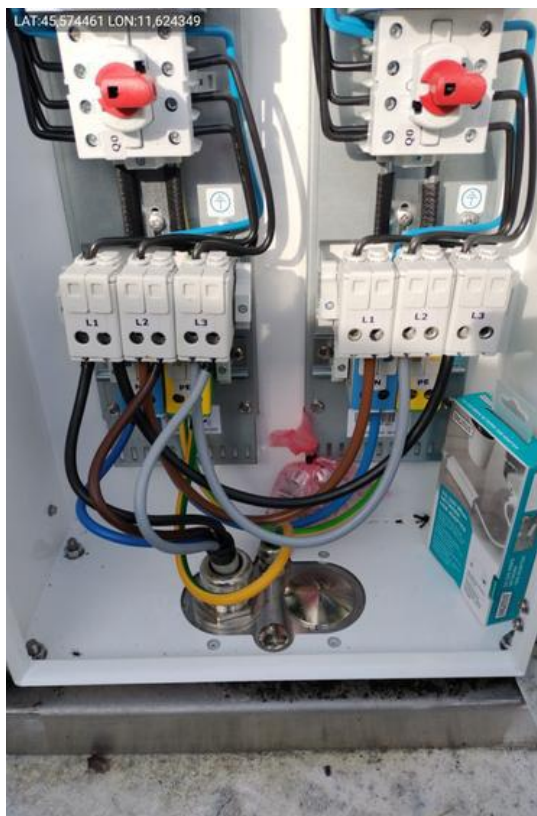


Photo 9



Photo 10

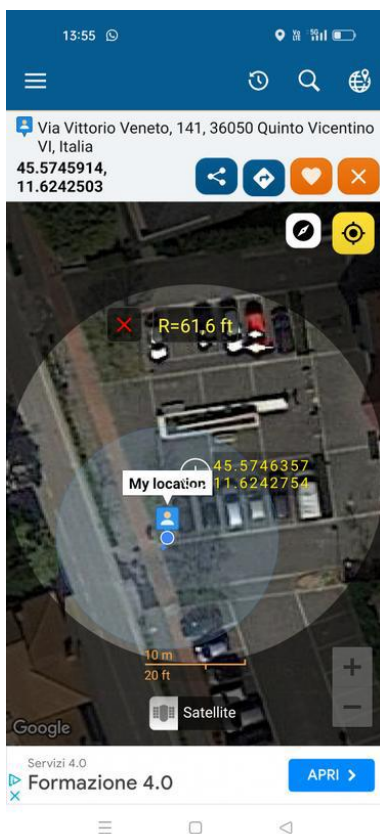


Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22

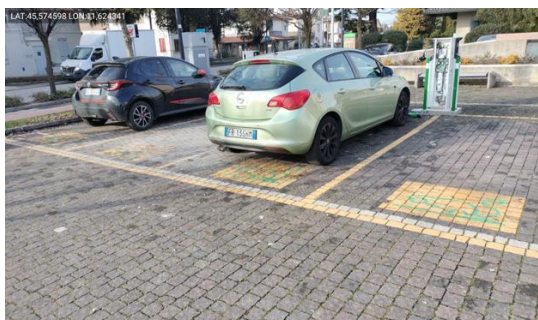


Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27
