

[ITA] Be Charge | Report di manutenzione ordinaria rev.01

23685 / DPS-MAN-O-22-02 / Dp service srl / 28 Dec 2023

Complete

Score	12 / 12 (100%)	Flagged items	0	Actions	0
-------	----------------	---------------	---	---------	---

Autodichiarazioni.

Il personale operante è stato adeguatamente formato, informato e addestrato ai sensi del D.Lgs.81/08, dall'Accordo Stato Regioni 2012 e dal Manufacturer delle infrastrutture di ricarica.

Confermo

La manutenzione in essere viene svolta utilizzando tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici per l'attività come indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale e come regolamentato dal D.Lgs.81/08.

Confermo



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4

La manutenzione in essere viene svolta utilizzando strumenti di misura correttamente tarati secondo la normativa vigente.

Confermo

Si prosegue allegando l'informativa rischi.

[OPS-001 Informativa Rischi rev.00.pdf](#)

Il personale operante ha preso visione dell'informativa rischi.

Confermo

Si prosegue con la raccolta delle informazioni preliminari.

N. ticket di manutenzione Deepser

DPS-MAN-O-22-02

Codice sito di intervento (CM)

23685

Indirizzo sito di intervento

Via Rosanna Benzi, 1a, 57025
Riotorto LI, Italia
(42.9786675, 10.6823266)

Impresa di manutenzione

Dp service srl

Nominativo del manutentore

Raffaele Azzurretti

Data e ora inizio manutenzione

28.12.2023 19:17 CET

Foto panoramica di come viene trovato il sito




Photo 5

Verifica segnaletica verticale

Compliant




Photo 6

Verifica segnaletica orizzontale

Compliant



Photo 7




Photo 8

Verifica accessibilità sito (presenza ostacoli, detriti o altro)

Compliant

Verifica pulizia del sito

Compliant

Inserire eventuali note e/o foto aggiuntive

Quadro elettrico generale

1 / 1 (100%)

Qual è la tipologia di fornitura della stazione di ricarica?

BT

Il Quadro Elettrico Generale (QE) è accessibile?

Si

Esame a vista integrità vano interruttori

Pass

Verifica corretta apertura e chiusura della portella del vano interruttori

Pass

Foto panoramica vano interruttori aperto



Photo 9

Esame a vista delle sigillature dei passaggi cavi

Pass

Esame a vista integrità fisica degli interruttori

Pass

Prova di funzionamento di tutti gli interruttori differenziali (premere tasto di TEST)

Pass

Prove di intervento di tutti gli interruttori differenziali (misura tempo di intervento in base alle norme CEI 23-18 e s.m.i.)

Pass

Verifiche di manovra di interruttori magnetotermici e sezionatori

Pass

Eeguire serraggio morsetti con idonei strumenti e DPI

Pass

Foto panoramica vano interruttori chiuso



Photo 10

Verifica del funzionamento dei comandi di emergenza e dei pulsanti di sgancio ai sensi della Guida CEI 0-10

1 / 1 (100%)

L'impianto prevede la presenza di un comando di emergenza/pulsante di sgancio?

No

Proseguire la manutenzione ordinaria seguendo le indicazioni presenti nelle successive sezioni.



Contattare il personale Be Charge al numero +39 340 420 0771 qualora fosse necessario ulteriore supporto.

EVC - Infrastruttura di ricarica

2 / 2 (100%)

Tipologia EVC in campo (selezione multipla possibile)

ENSTO EVF

Aggiungi premendo (+) e compila le informazioni richieste per ogni EVC in campo.

Si allega manuale istruzioni dell'EVC selezionata.

[0000002422.pdf](#)

ENSTO EVF

2 / 2 (100%)

ENSTO EVF 1

2 / 2 (100%)

Serial Number (S/N) dell'EVC

EVF213434871147859



Photo 11

Verifica integrità etichette di identificazione connettori

Pass



Photo 12




Photo 13

Verifica integrità fisica generale dell'EVC (prese, portelle, led, sigillature..)

Pass




Photo 14




Photo 15

Seleziona il logo istituzionale presente sull'EVC

Plenitude + Be Charge

Verifica presenza di adesivi pubblicitari estranei

Pass

Verifiche aggiuntive richieste dal produttore dell'EVC

Verifica corretta apertura sportello EVC fino a fine corsa

Pass

Verifica presenza pressacavi o schiuma poliuretanic

Pass

Indicare il girofasi presente sull'EVC

L1-L2-L3 -- L3-L1-L2




Photo 16

In assenza di tensione verifica serraggio di tutte le morsettiere, con particolare attenzione per i contatti di terra



In assenza di tensione verifica isolamento cavi e assenza spelature evidenti

Pass

Prova di funzionamento di tutti gli interruttori differenziali (premere tasto di TEST)

Pass

Verifica funzionamento riarmo automatico interruttore differenziale

Pass

Verifiche di manovra di interruttori magnetotermici e sezionatori

Pass

Si prosegue con le verifiche elettriche

Misura resistenza di terra (foto con visibile numero seriale dell'EVC sullo sfondo)

$\leq 100 \Omega$



Photo 17

La misura della resistenza di terra è compatibile con le caratteristiche dell'interruttore a protezione?

Si

Tensione L1-L2 = 400 V $\pm$ 10%

Pass

Tensione L2-L3 = 400 V $\pm$ 10%

Pass

Tensione L3-L1 = 400 V $\pm$ 10%

Pass

Tensione L1-N = 230 V $\pm$ 10%

Pass

Tensione L2-N = 230 V $\pm$ 10%

Pass

Tensione L3-N = 230 V $\pm$ 10%

Pass

Tensione N-PE $\leq$ 5 V

Pass

Si termina con i test di ricarica

Test di ricarica su presa

Test di ricarica su presa 1

Indicare presa sulla quale si effettua test di ricarica



Photo 18

Eeguire test di ricarica con tessera RFID. Documentare fotograficamente la ricarica in corso.

Pass



Photo 19

Test di ricarica su presa 2

Indicare presa sulla quale si effettua test di ricarica



Photo 20

Eeguire test di ricarica con tessera RFID. Documentare fotograficamente la ricarica in corso.

Pass




Photo 21

Firme

Foto panoramica di come viene lasciato il sito




Photo 22

Data e ora fine manutenzione

28.12.2023 19:25 CET

Firma del manutentore



Raffaele Azzurretti
28.12.2023 19:26 CET

Media summary



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4

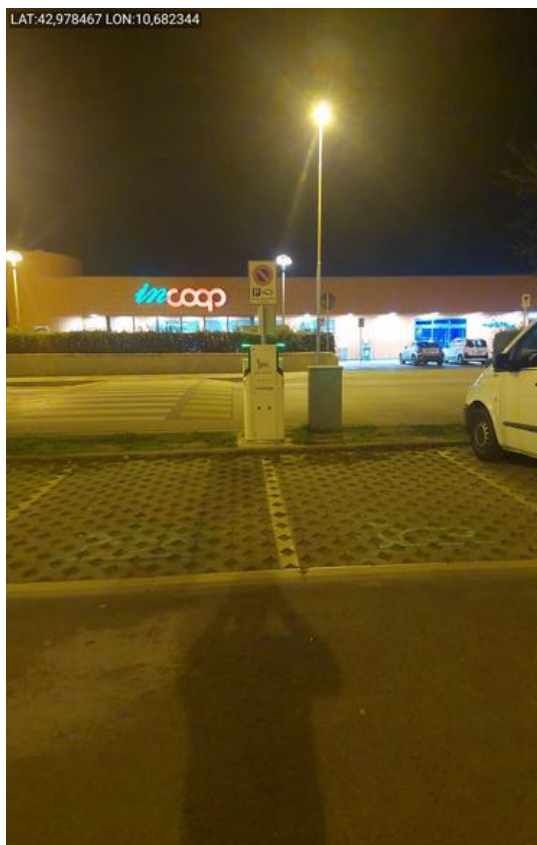


Photo 5

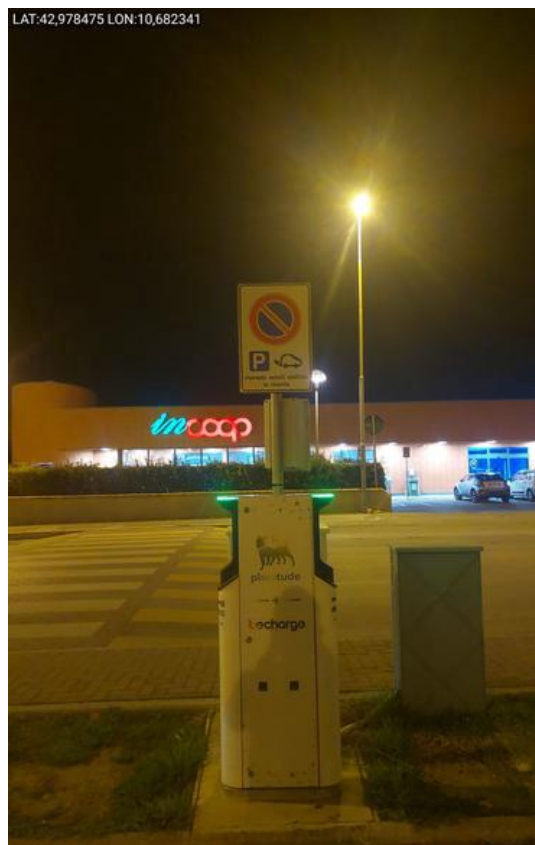


Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21

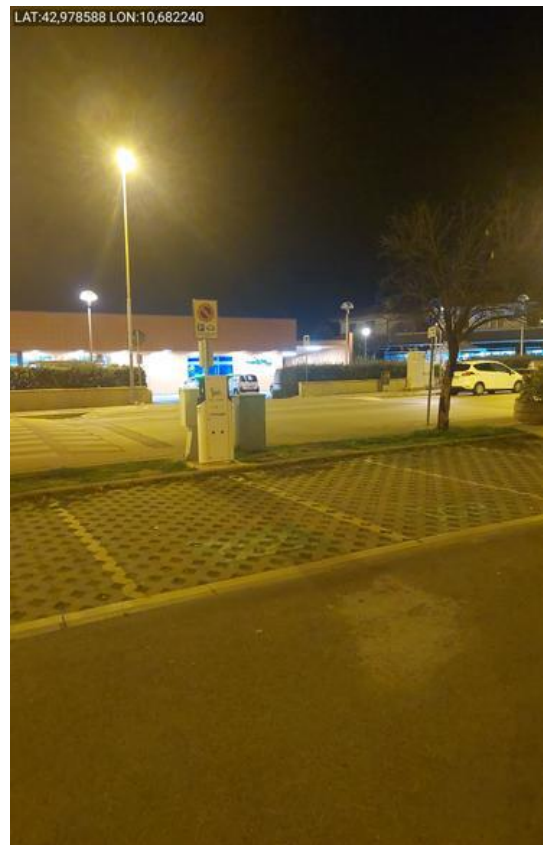


Photo 22
